RAIL LOGISTICS HUB ASTANA

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

# Мультимодальный железнодорожно-складской комплекс в Астане

Создание терминала полного цикла «вагон → склад → автомобиль» на действующей промышленной базе площадью 8 га с собственным железнодорожным тупиком

**8 га**
огороженная промплощадка

**1 640 м**
3 подъездных ЖД-пути

**7 957 м²**
существующие закрытые склады

**35–40**
вагонов единовременно

Подготовлено для потенциального инвестора проекта

Астана · 2026 · Конфиденциально

# Статус документа и методология

Документ подготовлен для принятия решения о входе в проект. Он сознательно не завышает привлекательность объекта: там, где данные не подтверждены документально, это указано прямо.

### ЧТО ЭТО ЗА ДОКУМЕНТ

Предварительный инвестиционный анализ (pre-feasibility). Он фиксирует концепцию, рынок, укрупнённую экономику и перечень проверок, которые необходимо выполнить до подписания договора.

**Не является** офертой, отчётом об оценке рыночной стоимости и финальной финансовой моделью.

### НА ЧЁМ ОСНОВАНО

- Характеристики объекта и перечень активов от собственника
- Интервью по железнодорожному тупику
- Открытые данные: БНС, НБК, генплан Астаны, требования КГД
- Рыночные обзоры складской недвижимости, данные о налоговых отчислениях конкурентов

### ЧЕГО ПОКА НЕТ

- Действующего АПЗ на строительство
- Технического паспорта ЖД-тупика
- Кадастровых и правоустанавливающих документов
- Технического обследования зданий и кранов
- Зафиксированной ставки арендной платы

**Принцип подхода.** Наличие железнодорожных путей и кранов само по себе не делает объект выгодным. Инвестиционная ценность возникает только в связке «ЖД-доступ + складские мощности + обработка груза + услуги», подтверждённой документами и реальным вагонопотоком.

# Суть проекта в одном экране

**0,87–1,34 млрд ₸**
CAPEX до запуска, без стоимости земли

**358 млн ₸**
выручка в год, базовый сценарий

**215 млн ₸**
EBITDA в год до арендной платы

**4,6 года**
простая окупаемость CAPEX

**60 /100**
предварительный Investment Score

## Вердикт: проект стоит доводить до инвестиционного решения — но не как «склад на 5 000 м²»

Объект даёт то, что невозможно быстро воспроизвести в черте Астаны: действующий железнодорожный тупик на 35–40 вагонов, 8 га огороженной территории с коммуникациями и почти 8 000 м² готовых складов. Экономика проекта формируется не арендой площадей, а обработкой груза.

**Вход возможен при трёх условиях:** подтверждённый правовой статус ЖД-путей и фактический вагонопоток; полученное АПЗ на строительство; арендная ставка, укладывающаяся в расчётный потолок проекта.

### ФОРМАТ СДЕЛКИ

| | |
|---|---|
| Структура | **Долгосрочная аренда, не покупка** |
| Земля | В частной собственности |
| Собственник | Физическое лицо (требуется комплаенс-проверка) |
| Текущий арендатор | ТОО «Tengri Hub» |
| Вложения инвестора | CAPEX в подготовку площадки и строительство |
| **Ключевой вопрос** | **Максимально допустимая аренда** |

РАЗДЕЛ I

# Объект и инвестиционный тезис

Что именно приобретает инвестор в пользование и почему это не рядовая складская площадка

# Инвестиционный тезис: продаём не квадратные метры, а маршрут груза

Клиент платит не за аренду помещения, а за сокращение цепочки: меньше перегрузов, меньше автоплеча, меньше простоя и оформления.

**Вагон** → Выгрузка на тупике → Склад / открытая площадка → Обработка и хранение → Комплектация → **Автодоставка клиенту**

И в обратном направлении: автомобиль → склад → погрузка в вагон → отправка

### Почему не «просто склад»

Аренда 5 000 м² по 5 000 ₸/м² — это около **300 млн ₸** валового потенциала в год *до* вакантности, коммунальных, персонала, охраны, ремонта, налогов и содержания путей. Средний по доходности проект с высокой конкуренцией.

### Что даёт терминал

Тот же актив с ЖД-фронтом, открытым хранением, ПРР и 3PL формирует **8 независимых источников выручки** и в базовом сценарии выходит на 358 млн ₸ при рентабельности по EBITDA около 60%.

### Барьер входа для конкурентов

Новый подъездной путь с примыканием к маневровому району станции Астана в черте города практически невоспроизводим: это годы согласований. **Актив дефицитен по своей природе.**

**Минус один перегруз**
Груз не перемещается между чужим терминалом и складом клиента

**Минус 30–50 км автоплеча**
Терминал расположен в городской черте, а не за его пределами

**Минус один день в цепочке**
Выгрузка, хранение и комплектация выполняются на одной площадке

# Объект сегодня: brownfield, а не пустая земля

Инвестор получает площадку с готовыми капитальными строениями, подключёнными сетями и работающим периметром безопасности.

| Закрытые помещения | Площадь, м² | Состояние по документам |
|---|---|---|
| Корпус №1, отапливаемый | 2 321,4 | требует обследования |
| Корпус №2, отапливаемый | 1 125,3 | требует обследования |
| Корпус №3, отапливаемый | 1 102,2 | требует обследования |
| Корпус №4, отапливаемый | 517,6 | требует обследования |
| 6 неотапливаемых ангаров | 2 890,7 | 407,5–560 м² каждый |
| **Итого закрытых складов** | **7 957,2** | **из них отапливаемых 5 066,5** |
| Административно-бытовой комплекс, 2 этажа | 931,8 | офис, персонал, клиентская зона |
| Гараж / депо | 913,4 | ремонт и стоянка техники |
| Оздоровительный комплекс | 316,1 | потенциал перепрофилирования |
| Столярный цех | 190,0 | тарное производство / упаковка |

**8 га**
огороженная территория

**5 066 м²**
отапливаемых складов

### ИНЖЕНЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Электроснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация — подключены и обслуживаются городскими организациями
- Ограждение по периметру, КПП, охрана 24/7
- Видеонаблюдение по периметру

**Экономический смысл:** часть выручки можно получать до завершения нового строительства — за счёт ремонта и сдачи существующих корпусов.

# Открытые зоны хранения и терминальные площадки

Именно открытые площадки дают проекту второй контур выручки — металл, стройматериалы, трубы, лес, контейнеры и негабарит.

**ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ**

**8 000 м²**

Металлопрокат, трубы, стройматериалы, оборудование

**ЗОНА СВХ ОТКРЫТОГО ТИПА**

**7 560 м²**

Потенциал таможенной обработки

**КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ**

**5 796 м²**

Обработка и хранение контейнеров

**ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД**

**3 917 м²**

Открытого типа

**ПОДКРАНОВАЯ ПЛОЩАДКА**

**440 м²**

Зона работы козловых кранов

### Важная оговорка по площадям

Указанные зоны **не суммируются механически**: по имеющимся документам неясно, являются ли они самостоятельными площадками или частично входят одна в другую. До получения топосъёмки и кадастрового плана эти цифры используются как ориентир, а не как расчётная база.

### Что это меняет для инвестора

- Открытое хранение не требует дорогого CAPEX — площадка монетизируется одной из первых
- Наличие зон под СВХ и таможенный склад создаёт опцион на существенно более маржинальный бизнес
- Контейнерная площадка в связке с ЖД-фронтом — прямой выход на импортные потоки из Китая

# Железнодорожная инфраструктура — ядро стоимости проекта

Это единственный актив площадки, который невозможно быстро создать заново, и одновременно — главный предмет технической и правовой проверки.

| Параметр | Значение по документам и интервью |
|---|---|
| Подъездные пути | **3 ветки, 1 640,4 пог. м** |
| Единовременная вместимость | 35–40 вагонов |
| Заявленный фронт выгрузки | до 53 вагонов |
| Расстояние от станции Астана | 675 пог. м до границы путей |
| Примыкание | стрелочный перевод №369 к хвосту крестовины №368 |
| Район примыкания | Северный маневровый район станции Астана |
| Подача и уборка вагонов | станционным тепловозом, оплата по тарифу |
| Собственный локомотив | отсутствует |
| Типы вагонов | крытые (тарно-штучные), полувагоны, платформы |
| Содержание и ремонт путей | осуществляет текущий арендатор |

**Цифры 35–40 и 53 вагона нельзя принимать как подтверждённую коммерческую мощность.** Это заявленные величины, которые должны быть подтверждены документально до принятия инвестиционного решения.

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПО ЖД

- Технический паспорт тупика
- Схема путевого развития
- Продольный профиль
- Акт обследования путей
- Инструкция по эксплуатации
- Договор примыкания с владельцем инфраструктуры
- Действующий технологический процесс
- Расчёт единовременной вместимости
- Ограничения по массе и длине состава
- Подтверждение режима подачи вагонов

# Погрузочная техника: актив с ограниченной оценкой

Техника присутствует физически, но её нельзя учитывать в инвестиционной стоимости до технической экспертизы.

| Единица техники | Год выпуска | Возраст | Позиция в модели |
|---|---|---|---|
| Козловой кран ККС-10 | 1980 | 46 лет | не учитывать |
| Козловой кран КСК-20 | 1983 | 43 года | не учитывать |
| Козловой кран КСК-20 | 1997 | 29 лет | после дефектовки |
| Автопогрузчики 1,6 и 2 т (2 ед.) | 2007 | 19 лет | вспомогательные |
| КамАЗ, Газель, трактор ЮМЗ | — | — | хозяйственная техника |

Оценка возраста приведена на 2026 год.

**Что требуется до включения кранов в модель**

- Обследование специализированной организацией
- Дефектовка и испытания
- Проверка документации и остаточного ресурса
- Регистрация и допуск к эксплуатации

**Риск:** формально «кран есть», а фактически его ввод в безопасную эксплуатацию потребует дополнительно **30–50 млн ₸**. Эта сумма заложена в CAPEX отдельной строкой.

РАЗДЕЛ II

# Локация, макросреда и конкуренция

Генеральный план Астаны, макроэкономика Казахстана, рынок складов и железнодорожной логистики, бенчмарк по действующим операторам

# Локация и генеральный план Астаны до 2035 года

Объект расположен в сложившейся промышленной среде района Байқоңыр, рядом с производственными и складскими предприятиями.

### Функциональное зонирование

Генплан столицы предусматривает развитие промышленных, коммунально-складских и транспортных территорий. В структуре зонирования отдельно выделены территории транспортной инфраструктуры и коммунально-складской застройки — целевое назначение проекта соответствует вектору развития города.

### Промышленное окружение

Соседство с действующими производствами (в частности, предприятие по обработке листового стекла на ул. Ақсеңгір) снижает риск конфликта с жилой застройкой и санитарными ограничениями, характерный для площадок на границе жилых массивов.

### Логистическое преимущество

Это не удалённый терминал в 50 км от города, а площадка внутри городской черты с примыканием к станции Астана. Для клиента это сокращение автоплеча на конечном участке и экономия на доставке.

**Критический блокер: действующее АПЗ отсутствует.** До его получения нельзя утверждать параметры нового строительства. Последовательность работ: генплан → функциональная зона → градостроительные ограничения → подтверждение возможности строительства → новое АПЗ → технические условия → проектирование. Площадь, этажность, отступы, санитарные и пожарные расстояния могут изменить конфигурацию проекта.

# Макроэкономика: сильный спрос при дорогих деньгах

Отраслевая динамика для логистического проекта близка к идеальной, но стоимость финансирования — главный макроограничитель.

**+6,5 %**
реальный рост ВВП Казахстана, 2025

**+19,4 %**
транспорт и складирование, 2025

**+17,5 %**
строительство, 2025

**+8,1 %**
торговля, 2025

### Стоимость денег — ограничение проекта

**16,25 %**
базовая ставка НБК (±1 п.п.)

**9,8 %**
годовая инфляция, Казахстан и Астана

Считать проект по ставке 10–12% годовых сегодня нельзя без подтверждённой программы льготного финансирования. В модель заложены: индексация аренды 5–8% в год, рост OPEX 8–10%, резерв на строительство +10–15%.

### Налоговая среда 2026 года

| | |
|---|---|
| НДС | **16%** |
| КПН, базовая ставка | **20%** |
| Налог на имущество юридических лиц | **1,5%** базы |

Повышение НДС с 2026 года напрямую влияет на оборотный капитал терминала и должно быть отражено в помесячном Cash Flow первых 24 месяцев.

# Рынок качественной складской недвижимости

Предложение растёт, но концентрировано в двух городах; ставки в Астане позволяют строить экономику нового объекта.

**1,78 млн м²**
качественных складов в Казахстане, III кв. 2025

**+15 %**
прирост предложения за год

**80 %**
качественного предложения — Алматы и Астана

**4,5–5,5 тыс. ₸**
актуальные предложения 2026 в Астане, ₸/м²/мес + OPEX

СТАВКИ АРЕНДЫ ПО КЛАССАМ, ₸/М²/МЕСЯЦ




Проект позиционируется в классе **B+/A−** с ключевым отличием от конкурентов — собственным железнодорожным фронтом. Ставка базового сценария 5 000 ₸/м² находится в середине рыночного диапазона, то есть модель не построена на завышенных допущениях.

**Драйвер: импорт и торговля**
Рост товарооборота формирует спрос на распределительные мощности в столице

**Драйвер: e-commerce**
Фулфилмент и обработка заказов требуют складов с сервисом, а не «коробок»

**Драйвер: строительство**
+17,5% за год — прямой спрос на открытое хранение стройматериалов

**Драйвер: дистрибуция и FMCG**
Потребность в ответственном хранении и комплектации под сеть

# Железнодорожные грузоперевозки Казахстана

Для проекта значим не абсолютный объём рынка, а устойчивый рост грузопотока и загрузка инфраструктуры.

**466,7 млн т**
перевезено ЖД-транспортом, 2025

**+6,8 %**
рост объёма перевозок за год

**+10,2 %**
рост грузооборота

### Методологическая оговорка

Официальные источники дают различающиеся показатели (порядка 466,7 млн т и около 320 млн т в другом статистическом контексте). Различие связано с методологией учёта грузов. Для оценки проекта необходимо использовать показатель, соответствующий **потенциальному грузопотоку конкретного терминала**, а не страновой агрегат.

### Что из этого следует для терминала

- Растущий грузопоток означает конкуренцию за приёмо-сдаточные мощности в узлах
- Тупик с фронтом на 35–40 вагонов в черте столицы становится дефицитным ресурсом
- Импортные потоки из Китая формируют устойчивый спрос на схему «вагон → склад → город»
- Целевой сегмент — грузы, для которых перегруз и автоплечо составляют существенную долю себестоимости

# Конкурентное поле: кто уже работает по этой модели


Модель «склад + ЖД + СВХ + услуги» в Казахстане подтверждена действующими операторами — спрос на неё не гипотетический.

| Оператор | Формат | ЖД | Склад | СВХ | Открытая площадка | Ключевые услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAPA Logistics** | 3PL-оператор | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ответхранение, ПРР, WMS, кросс-докинг, маркировка, услуги ЖД-тупика |
| **Astana Railways** | ЖД-терминал / СВХ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Аренда подъездных путей, маневровые операции, погрузка/выгрузка, СВХ |
| **Rainbow Logistics** | Складской комплекс класса А | ✓ | ✓ | — | ✓ | 12 467 м² GBA, фулфилмент до 30 тыс. заказов в сутки |
| **AIE Logistics** | Логистика и склады | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Комплексная логистика, хранение, таможенные операции |
| **CBX Bastau** | Склад временного хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Таможенное хранение и обработка |
| **Astana Cargo Service** | Терминал / склад | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Терминальная обработка грузов |
| **CDK** | Промышленные склады | ✓ | ✓ | — | ✓ | Склады + ЖД-тупик + краны + открытые площадки |

**Вывод:** прямых аналогов с полным набором функций в Астане немного, и почти все они — крупные состоявшиеся операторы. Проект входит не в пустой рынок, а в рынок с доказанной моделью, где преимуществом становятся расположение внутри города и размер площадки под расширение.

# Бенчмарк масштаба: налоговые отчисления операторов, 2025

Налоговые платежи — не прибыль, но надёжный прокси реального масштаба бизнеса и подтверждение того, что модель работает.

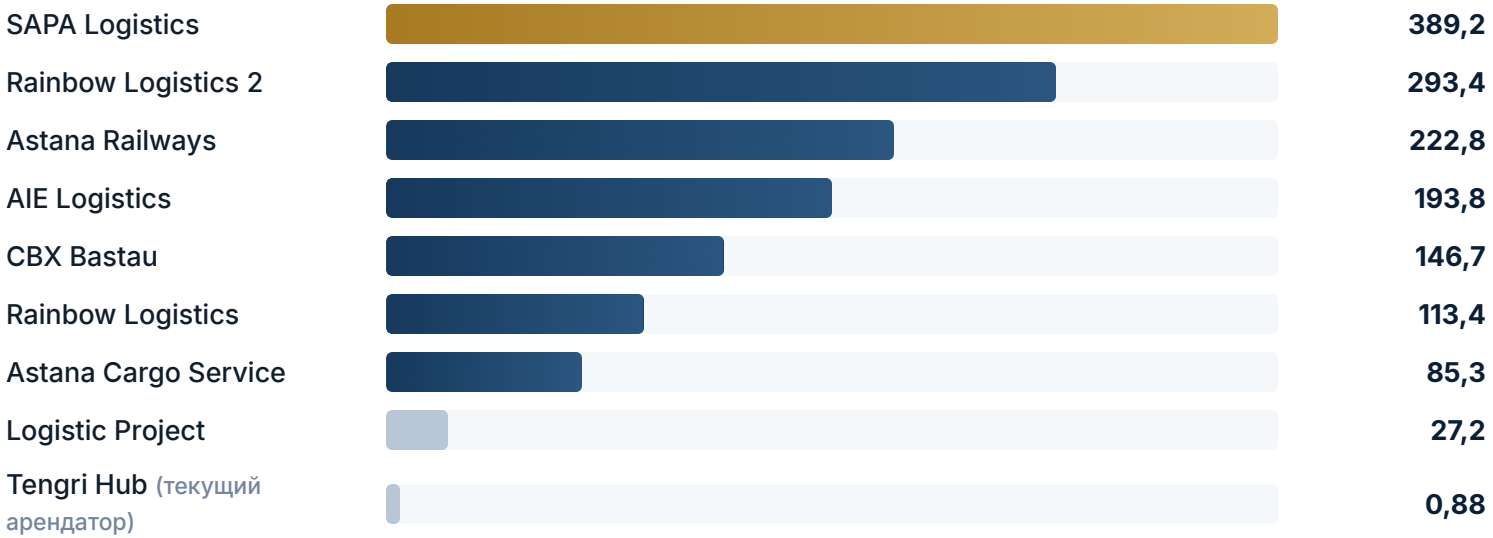


Налоговые отчисления за 2025 год, млн ₸. Данные КГД через коммерческие базы. Показатель включает НДС, КПН, социальные и иные платежи.

### Ключевое наблюдение

Текущий арендатор площадки платит **0,88 млн ₸** налогов в год, тогда как операторы сопоставимых терминалов — **от 85 до 389 млн ₸**. Это означает, что актив сегодня практически не монетизируется.


### КАК ЧИТАТЬ ЭТИ ДАННЫЕ

- Налоги ≠ прибыль: показатель отражает оборот и фонд оплаты труда
- Использовать только как proxy масштаба, не как оценку доходности
- Разрыв между текущим использованием и отраслевым уровнем — это и есть создаваемая проектом стоимость

# Динамика лидеров подтверждает потенциал модели


У операторов, совмещающих склад, ЖД и сервис, масштаб бизнеса растёт кратно — это лучший доступный индикатор спроса.

### SAPA Logistics — рост в 3,7 раза за три года




Налоговые отчисления, млн ₸. Модель: ответхранение + 3PL + ЖД + СВХ + сервисные услуги.

### Rainbow Logistics — рост в 2,6 раза за три года

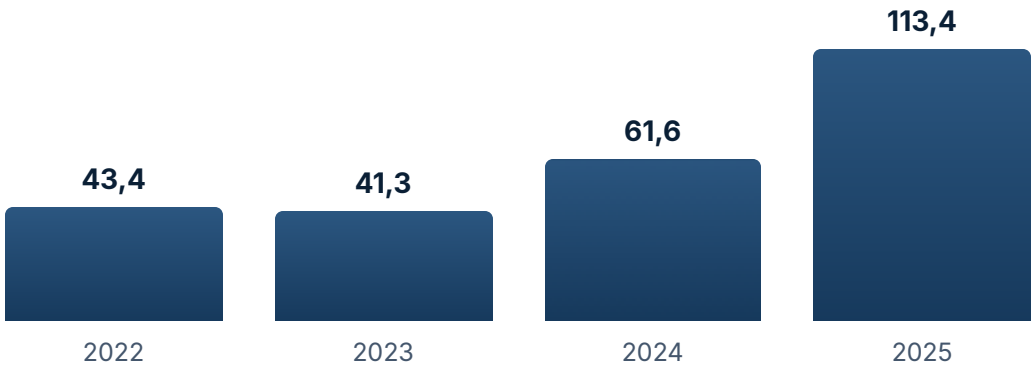


Налоговые отчисления, млн ₸. Объект: 12 467 м² GBA / 11 867 м² GLA, класс А, ЖД-пути, фулфилмент.

**Вывод для модели:** бизнес «сдаём помещение» и бизнес «обрабатываем груз» отличаются не процентами, а порядком величины. Проект должен строиться по второй модели — иначе его доходность будет соответствовать обычной складской аренде.

РАЗДЕЛ III

# Концепция терминала

Сценарии развития площадки, мастер-план, техническое решение по железнодорожному фронту и продуктовая линейка

# Три сценария освоения площадки

Проект реализуется поэтапно: денежный поток начинается до завершения основного строительства, что снижает пиковую потребность в капитале.

Сценарий A · старт

### Минимальный CAPEX

Монетизация существующей инфраструктуры без нового строительства.

- Уборка территории и вывоз мусора
- Демонтаж явно ненужных объектов
- Ремонт дорог, освещение, ограждение
- Восстановление и ремонт ЖД-путей
- Ремонт существующих складов
- Погрузочная техника и базовая IT-инфраструктура

**Результат:** первая выручка от аренды существующих корпусов и открытого хранения.

Сценарий B · базовый

### Терминал 5 000 м²

Основной инвестиционный сценарий, на котором построена финансовая модель.

- Новый склад 5 000 м² класса B+/A–
- Крытый железнодорожный фронт
- Погрузочно-разгрузочный комплекс
- Открытая площадка хранения
- Ответственное хранение и 3PL
- Контейнерная обработка

**Результат:** выручка ≈358 млн ₸ и EBITDA ≈215 млн ₸ в год.

Сценарий C · развитие

### Логистический оператор


Переход от арендного бизнеса к сервисной компании.

- Все мощности сценария B
- СВХ и таможенный склад
- Полноценный контейнерный терминал
- WMS, кросс-докинг, весовой комплекс
- Собственная погрузочная техника
- В перспективе — собственная маневровая техника

**Результат:** выручка до ≈480 млн ₸ и EBITDA до ≈317 млн ₸ в год.

# Предварительный мастер-план территории

Принцип организации: железнодорожный фронт в центре, склад примыкает к путям, автомобильный контур вынесен к КПП — движение груза без встречных потоков.

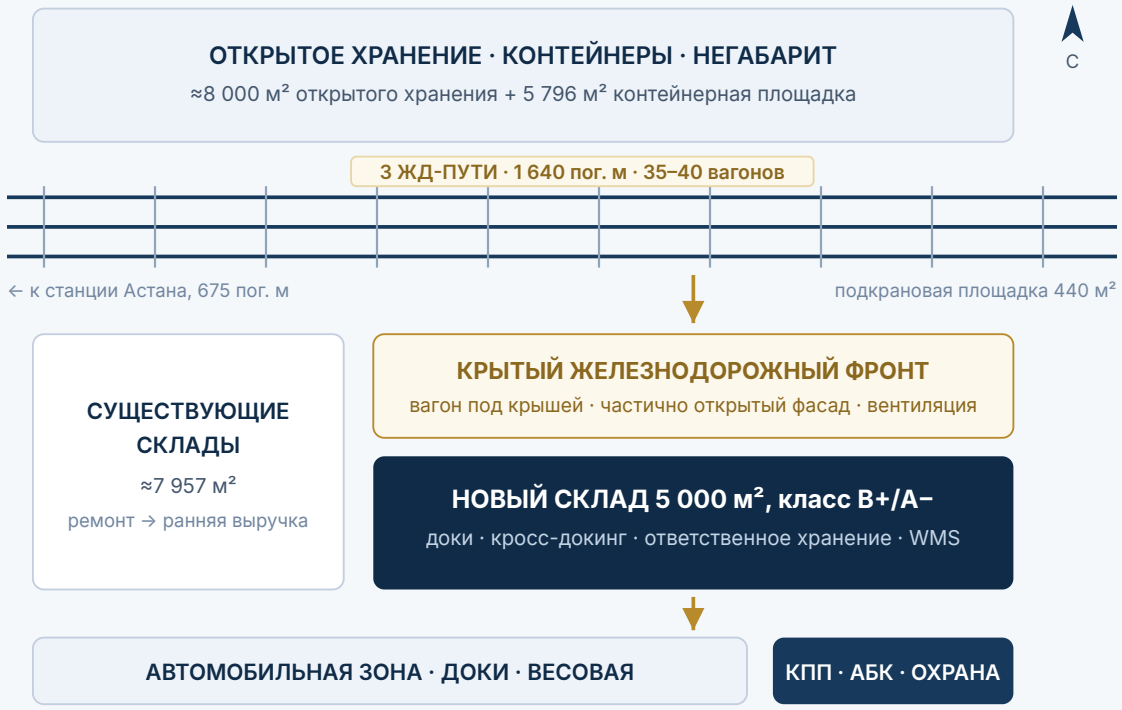


### ЛОГИКА ПЛАНИРОВКИ

- Склад примыкает к путям — исключается внутренний перегруз
- Открытое хранение вынесено за пути: тяжёлые и негабаритные грузы не пересекают складской контур
- Автомобильный въезд и весовая — в зоне КПП, вне зоны маневровых работ
- Резерв 8 га позволяет расширять мощности без перестройки схемы

Финальная планировка возможна только после получения **топографической съёмки, кадастрового плана и АПЗ**. Приведённая схема — принципиальная.

# Техническое решение: крытый ЖД-фронт вместо закрытого ангара

Это одно из решений, которое одновременно снижает CAPEX, упрощает согласования и повышает безопасность объекта.

Отклонённый вариант

### Полностью закрытый железнодорожный ангар

Подача вагонов выполняется станционным тепловозом — собственного локомотива нет. Заезд дизельного маневрового локомотива в закрытый объём создаёт связку проблем:

- Выхлоп дизеля в замкнутом пространстве
- Требования промышленной вентиляции
- Повышенная категория по пожарной безопасности
- Существенное удорожание конструкции и инженерии
- Усложнение и удлинение согласований

Такая концепция допустима только при письменном подтверждении профильного инженера.

Рекомендуемый вариант

### Крытый железнодорожный фронт

Вагон оказывается под крышей, но объём не является полностью замкнутым:

- Часть фасада остаётся открытой
- Локомотив не заходит глубоко внутрь
- Предусмотрена естественная и механическая вентиляция
- Погрузка и выгрузка выполняются непосредственно под навесом

**Дешевле**
70–120 млн ₸ против стоимости капитального ангара

**Безопаснее**
Нет накопления выхлопных газов

**Проще**
Меньше согласований и технических условий

**Круглогодичность как коммерческий аргумент:** крытый фронт позволяет вести выгрузку чувствительных к осадкам грузов в зимний период — в климате Астаны это прямое конкурентное преимущество перед открытыми тупиками.

# Восемь источников выручки вместо одного

Диверсификация потоков снижает чувствительность проекта к вакантности складских площадей.

01 · БАЗОВЫЙ ПОТОК

### Аренда складских площадей

₸/м²/месяц. Долгосрочные договоры, предсказуемый денежный поток.

02 · ЯДРО МАРЖИ

### Ответственное хранение

₸/паллето-место/сутки или ₸/тонна. Контрактные объёмы, высокая добавленная стоимость.

03 · УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

### Приём и обработка вагона

₸/вагон. Услуга, недоступная конкурентам без собственного тупика.

04 · СОПУТСТВУЮЩЕЕ

### Подача и уборка вагонов

₸/операция. Перевыставление тарифа станции с маржой при экономической целесообразности.

05 · ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНОЕ

### Погрузочно-разгрузочные работы

₸/тонна, ₸/вагон или ₸/операция. Загрузка кранов и техники.

06 · НИЗКИЙ CAPEX

### Открытое хранение

₸/м²/месяц. Металл, трубы, лес, стройматериалы, оборудование, негабарит.

07 · ИМПОРТНЫЙ ПОТОК

### Контейнерный терминал

₸/контейнер. Обработка, хранение, выдача.

08 · 3PL

### Дополнительные услуги

Сортировка, упаковка и переупаковка, маркировка, паллетирование, кросс-докинг, комплектация, взвешивание, оформление, экспедирование, доставка.

**Главный конкурент проекта — не соседний склад, а действующая логистическая схема клиента.** Сегодня: Китай → вагон → чужой терминал → автомобиль → склад клиента. Предложение проекта: Китай → наш тупик → выгрузка → наш склад → доставка. Если клиент экономит один перегруз, один день, 30–50 км автоплеча и простой — он готов платить премию к рынку.

# СВХ и таможенный склад: отдельный бизнес и отдельный upside

Статус СВХ не присваивается фактом наличия площадки — это лицензируемая деятельность с формальными требованиями КГД.

### ТРЕБОВАНИЯ КГД К ОБЪЕКТУ

- Обустройство и ограждение территории
- Контроль въезда и выезда
- Оборудованные места досмотра
- Весовое оборудование и погрузочная техника
- Подъездные пути и твёрдое покрытие
- Страхование ответственности
- Информационные системы учёта
- Отсутствие налоговых задолженностей

### ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ — ОТДЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Система должна обеспечивать государственным органам **удалённый доступ к видеопотоку в реальном времени** и хранение записей **не менее 30 дней**.

Существующее периметральное видеонаблюдение, скорее всего, придётся модернизировать — статья включена в CAPEX (10–20 млн ₸).

### Позиция в модели

Доход от СВХ **не включён в базовый сценарий** до официального подтверждения возможности его получения. СВХ рассматривается исключительно как **upside**, повышающий доходность, но не обеспечивающий окупаемость проекта.

**Формулировка «нужно договориться с КНБ» юридически некорректна.**

Таможенный блок — это КГД, таможенный пост, СВХ и досмотровые зоны. Компетенция пограничной службы возникает там, где есть государственная граница и пограничный режим.

Для внутригородского терминала в Астане режим приграничного СВХ автоматически не применяется. Требуется официальное письменное разъяснение КГД по перечню согласований для функционирования объекта.

РАЗДЕЛ IV

# Экономика проекта и структура сделки

CAPEX, сценарии операционной модели, предельная арендная плата, финансирование и условия возврата капитала инвестору

# CAPEX: инвестиции до запуска терминала

Предварительная оценка по укрупнённым статьям. Ориентир подрядчиков «от 75 000 ₸/м² под ключ» относится только к зданию и не может использоваться как бюджет проекта.

| Статья затрат | Мин., млн ₸ | Макс., млн ₸ |
|---|---|---|
| Новый склад 5 000 м² | 375 | 500 |
| Дороги и площадки с твёрдым покрытием | 80 | 120 |
| Крытый железнодорожный фронт | 70 | 120 |
| Инженерные сети | 50 | 80 |
| Реконструкция железнодорожных путей | 30 | 70 |
| Демонтаж и снос | 30 | 60 |
| Земляные работы | 30 | 50 |
| Проектирование и экспертиза | 30 | 50 |
| Краны и погрузочная техника | 30 | 50 |
| Пожарная система | 25 | 40 |
| Очистка территории | 20 | 40 |
| Видеонаблюдение и СКУД | 10 | 20 |
| Весовое оборудование | 10 | 20 |
| Резерв на непредвиденные расходы | 80 | 120 |
| **Итого CAPEX** | **870** | **1 340** |

**1,0 млрд ₸**

расчётная величина CAPEX, принятая в финансовой модели

### ЧТО НЕ ВХОДИТ В CAPEX

Стоимость земли и существующих строений: сделка структурируется как **аренда**, поэтому земельная составляющая учитывается в операционных расходах, а не в капитальных вложениях.

**Дисциплина бюджета.** После получения технического обследования зданий и путей укрупнённая оценка должна быть заменена сметой. При инфляции 9,8% в модель дополнительно закладывается contingency 10–15% на период строительства.

# Операционная модель: три сценария

Расчёт выполнен от CAPEX 1,0 млрд ₸ и приведён до вычета арендной платы за площадку — предельная аренда рассматривается отдельно.

| Показатель | Пессимистичный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Ставка аренды склада, ₸/м²/мес | 4 200 | **5 000** | 5 600 |
| Загрузка складских площадей | 70% | **85%** | 92% |
| Железнодорожная активность | ограниченная | **≈300 вагонов/год** | интенсивная |
| Прочие услуги | минимум | **ПРР, открытая площадка** | ПРР, 3PL, СВХ |
| **Выручка, млн ₸/год** | ≈222 | **≈358** | ≈480 |
| **EBITDA до аренды, млн ₸/год** | ≈116 | **≈215** | ≈317 |
| Рентабельность по EBITDA | ≈52% | **≈60%** | ≈66% |
| **Простая окупаемость CAPEX, лет** | **≈8,6** | **≈4,6** | **≈3,2** |

**Оптимистичный сценарий не используется как базовый.** Он показывает потенциал при подтверждении статуса СВХ и выходе на полноценный 3PL, но не может служить основанием для инвестиционного решения.

**Ключевая проверка перед моделью:** вклад железнодорожной составляющей в выручку должен быть подтверждён фактическим вагонопотоком за 24–36 месяцев. Без этого базовый сценарий является гипотезой.

# Структура сделки: аренда меняет логику инвестирования

Инвестор вкладывает капитал в улучшения на чужой земле. Поэтому договор аренды по значимости равен самой экономике проекта.

### Главный риск конструкции

Инвестор строит объект за свои средства → срок аренды истекает → неотделимые улучшения остаются на земле собственника. Без юридической защиты это прямая потеря капитала.

### Альтернатива аренде — совместное предприятие

Собственник вносит землю и существующие активы, инвестор финансирует создание терминала, стороны входят в SPV с заранее согласованной формулой распределения прибыли. В этом случае арендная плата перестаёт быть основной формой расчётов, а интересы сторон выравниваются на всём горизонте проекта.

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

- **Срок:** 10 лет + опция продления на 5 лет
- **Арендные каникулы** на период строительства
- **Индексация** — формула и потолок
- **Депозит** и порядок его возврата
- **Компенсация** неотделимых улучшений
- **Право выкупа** или приоритет при продаже
- **Запрет** досрочного одностороннего расторжения
- **Возможность залога** прав аренды для проектного финансирования
- **Право субаренды** — основа складского бизнеса
- **Распределение** земельного налога и налога на имущество
- **Ответственность** за капремонт, здания и ЖД-пути
- **Сохранение** договора при смене собственника

**Возможность залога прав аренды — критическое условие.** Без него проект невозможно профинансировать банковскими деньгами, а инвестор лишается инструмента защиты вложений.

# Максимально допустимая арендная плата — ключевой параметр сделки

Поскольку земля не приобретается, доходность проекта определяется не ценой актива, а размером арендного платежа.

| Аренда, млн ₸/мес | Аренда, млн ₸/год | EBITDA после аренды | Окупаемость CAPEX | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 179 | 5,6 года | комфортно |
| 5 | 60 | 155 | 6,5 года | приемлемо |
| 8 | 96 | 119 | 8,4 года | предел |
| 12 | 144 | 71 | 14,1 года | не проходит |
| 15 | 180 | 35 | 28,6 года | не проходит |
| 20 | 240 | −25 | убыток | неприемлемо |

Расчёт от базового сценария: EBITDA до аренды ≈215 млн ₸/год, CAPEX 1,0 млрд ₸. Простая окупаемость приведена без дисконтирования и налогового эффекта; в полной модели показатель уточняется через NPV и IRR.

### Расчётный потолок аренды

**5–8 млн ₸/мес**

Это ориентировочно 60–96 млн ₸ в год, или около 60–100 ₸ за м² территории в месяц. Выше этого уровня проект перестаёт быть инвестиционным и превращается в операционный бизнес с доходностью ниже стоимости денег.

**Важное расхождение, требующее сверки.** Ориентиры арендной платы уровня 20–40 млн ₸ в месяц, которые обсуждались ранее, при текущем масштабе EBITDA проект не выдерживает. Ставку необходимо согласовывать исходя из расчётного потолка, а не из ожиданий по рыночной стоимости земли.

**Арендные каникулы на 12–18 месяцев строительства** эквивалентны экономии 60–90 млн ₸ и являются предметом торга наравне со ставкой.

# Финансирование и возврат капитала инвестору

При базовой ставке 16,25% агрессивное кредитное плечо разрушает проект. Структура должна опираться на собственный и партнёрский капитал.

### ПОЧЕМУ НЕ 50% ДОЛГА

Расчёт при общей стоимости проекта 1,48 млрд ₸ и доле долга 50%:

| | |
|---|---|
| Сумма кредита | **740 млн ₸** |
| Условная ставка | **20%** |
| Срок | **7 лет** |
| Обслуживание долга | **≈197 млн ₸/год** |
| EBITDA базового сценария | **215 млн ₸/год** |
| **DSCR** | **≈1,09x** |

Запас прочности менее 10%: любое отклонение по загрузке или срокам запуска приводит к дефолту по обслуживанию долга.

### Рекомендуемая структура капитала

**Вариант 1 — приоритетный:** 60–70% собственные и инвесторские средства, 30–40% долг. Целевой DSCR — не ниже 1,5x.

**Вариант 2:** партнёрство с собственником земли. Земля и существующая база вносятся как вклад, инвестор финансирует строительство, стороны участвуют в SPV.

Кредитование по ставке 10–12% возможно только в рамках подтверждённой программы поддержки. До получения такого подтверждения модель считается по рыночной ставке.

### СТРУКТУРА ВОЗВРАТА ИНВЕСТОРУ

Вместо упрощённой договорённости «доля в прибыли» применяется стандартная схема распределения:

1. **Возврат капитала**
   Инвестор первым получает возврат вложенных средств
2. **Preferred return**
   Приоритетная доходность, ориентир — 18% годовых на вложенный капитал
3. **Распределение остатка**
   Например, 70/30 по EBITDA в пользу оператора проекта

Конкретные параметры waterfall фиксируются в акционерном соглашении по итогам финальной финансовой модели.

РАЗДЕЛ V

# Риски, due diligence и план входа

Карта рисков, юридический и комплаенс-контур, перечень документов Data Room, дорожная карта и итоговый вывод

# Карта рисков проекта

Оценка по двум осям: вероятность наступления и величина ущерба для инвестиционного результата.

| | НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ | СРЕДНЯЯ ВЕРОЯТНОСТЬ | ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ |
|---|---|---|---|
| **КРИТИЧЕСКИЙ УЩЕРБ** | **Смена собственника или досрочное расторжение аренды**<br>Митигация: долгосрочный договор, сохранение при переходе права, компенсация улучшений | **Правовой статус ЖД-путей и договор примыкания**<br>Митигация: проверка балансовой и эксплуатационной принадлежности каждого метра пути | **Отсутствие АПЗ — параметры строительства не подтверждены**<br>Митигация: получение АПЗ и ТУ до начала CAPEX |
| **СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ** | **Отказ в статусе СВХ**<br>Митигация: СВХ не учтён в базовом сценарии, только upside | **Фактический вагонопоток ниже заявленного; рост CAPEX при инфляции 9,8%**<br>Митигация: запрос истории за 24–36 мес, contingency 10–15% | **Состояние кранов 1980–1997 гг.; стоимость денег при ставке 16,25%**<br>Митигация: 30–50 млн ₸ в CAPEX, ограничение доли долга |
| **УМЕРЕННЫЙ УЩЕРБ** | **Экологические и пожарные требования**<br>Митигация: учёт на стадии проектирования | **Конкуренция со стороны действующих операторов**<br>Митигация: дифференциация по ЖД-фронту и расположению в городе | **Рост OPEX и тарифов на подачу/уборку вагонов**<br>Митигация: индексационные оговорки в клиентских договорах |

**Самая дорогая ошибка проекта** — предположить, что наличие тупика означает право свободно им распоряжаться. Правовой статус путей, границы ответственности и режим подачи вагонов должны быть подтверждены документами до внесения аванса.

# Юридический и комплаенс-контур

Собственник — физическое лицо, связанное с государством. Это не является риском само по себе, но требует формальной проверки до подписания документов.

### КОМПЛАЕНС СОБСТВЕННИКА

- Идентификация лица и его статуса
- Наличие государственной должности
- Отнесение к категории PEP или связанных лиц
- Конечный бенефициар
- Наличие конфликта интересов
- Основание и история приобретения земли
- Ограничения на использование участка
- Связанные компании
- Залоги, обременения, обязательства перед государством

### ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ БЛОК

- Право собственности и история переходов
- Обременения, аресты, сервитуты
- Целевое назначение и соответствие фактическому использованию
- Границы участка и кадастровые координаты
- Кадастровая стоимость
- Статус: собственность или аренда у государства

Несоответствие целевого назначения планируемой деятельности — самостоятельный стоп-фактор сделки.

### Разграничение полномочий

**Таможенный блок:** КГД, таможенный пост, СВХ, таможенный склад, досмотровые зоны, требования к обустройству.

**Пограничный блок:** компетенция возникает при наличии государственной границы и пограничного режима; для внутригородского терминала не применяется автоматически.

**Действие:** получить официальное письменное разъяснение КГД по перечню согласований для функционирования объекта как СВХ или таможенного склада.

# Data Room: документы, запрашиваемые до внесения аванса

Перечень формируется как обязательное приложение к соглашению о намерениях.

### ЗЕМЛЯ

- Правоустанавливающий документ / госакт
- Кадастровый план и координаты границ
- Целевое назначение
- Кадастровая стоимость
- Справка об обременениях и сервитутах
- История переходов права

### ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

- Технический паспорт по каждому объекту
- Правоустанавливающие документы
- Площадь и год постройки
- Конструктив и фундаменты
- Инженерные системы
- Акты ввода в эксплуатацию
- Отчёт технического обследования

### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС

- Технический паспорт, схема, продольный профиль
- Инструкция по эксплуатации
- Договор примыкания и договор подачи/уборки
- Акты обследования и ремонта путей
- Балансовая и эксплуатационная принадлежность, границы ответственности
- Тарифы на подачу и ограничения по составу
- Длина, радиусы и допустимые типы вагонов

### ИСТОРИЯ РАБОТЫ ТУПИКА

За **24–36 месяцев** помесячно:

- Количество принятых вагонов
- Номенклатура и направления грузов
- Время подачи и уборки
- Простои и аварийные случаи
- Платежи за подачу и ремонт путей

**Отсутствие данных о фактическом вагонопотоке — красный флаг сделки.**

# Дорожная карта: от переговоров до выхода на мощность

Капитальные затраты запускаются только после снятия юридических блокеров и подтверждения спроса якорными клиентами.

**0–3**

### Due diligence и сделка

- Сбор Data Room
- Юридическая и комплаенс-проверка
- Обследование зданий, путей, кранов
- Согласование условий аренды и ставки

**3–6**

### Разрешительный этап

- Получение АПЗ и ТУ
- Топосъёмка, кадастровый план
- Разъяснение КГД по СВХ
- Старт проектирования

**6–9**

### Ранняя монетизация

- Экспертиза проекта
- Уборка и подготовка территории
- Ремонт существующих складов
- Запуск открытого хранения

**9–12**

### Строительство

- Склад 5 000 м²
- Крытый ЖД-фронт
- Реконструкция путей
- Инженерные сети и пожарная система

**12–18**

### Запуск терминала

- Ввод в эксплуатацию, WMS, весовой комплекс
- Заезд якорных клиентов
- Выход на целевую загрузку 85%
- Подача документов на СВХ

**6 месяц**
решение о запуске капитальных затрат

**9 месяц**
первая выручка от существующих мощностей

**15 месяц**
ввод нового склада в эксплуатацию

**18 месяц**
выход на целевую загрузку 85%

**Контрольная точка перед CAPEX:** переход к этапу строительства допускается только при одновременном выполнении трёх условий — получено АПЗ, подтверждён правовой статус ЖД-путей, подписаны предварительные договоры с якорными клиентами.

# Якорные клиенты: коммерческое условие запуска стройки

Кампания pre-lease проводится до начала капитальных затрат и служит объективной проверкой спроса на ЖД-доступ.

### Цель до старта CAPEX

**2–3** якорных клиента

на **30–50%** будущей складской площади. Ориентировочная структура портфеля:

| | |
|---|---|
| Клиент А | **1 500 м²** |
| Клиент Б | **1 000 м²** |
| Клиент В | **500 м²** |
| **Итого предварительных контрактов** | **3 000 м²** |

## ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ КЛИЕНТОВ

**Металлургия и металлопрокат**
Полувагоны, платформы, открытое хранение, краны

**Стройматериалы и цемент**
Сезонные объёмы, крытый фронт, площадки

**Трубная продукция**
Негабарит, крановая обработка

**Импортёры из Китая**
Контейнеры, СВХ, таможенная обработка

**Дистрибьюторы и FMCG**
Ответственное хранение, комплектация

**E-commerce и фулфилмент**
3PL, обработка заказов, доставка

**Производственные компании**
Сырьё вагонами, готовая продукция автотранспортом

**Оборудование и проектные грузы**
Разовые крупные партии, негабарит

**Зачем это инвестору.** Подписанные предварительные договоры выполняют три функции: подтверждают реальный спрос именно на ЖД-доступ, снижают риск простоя новых площадей после ввода и служат аргументом при переговорах о проектном финансировании.

# Предварительный инвестиционный рейтинг

Оценка по десяти блокам, каждый — до 10 баллов. Рейтинг отражает готовность проекта к инвестиционному решению, а не его потенциал.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Актив и инфраструктура | 8/10 | Локация и генплан | 8/10 |
| Рынок и спрос | 8/10 | Конкурентная позиция | 7/10 |
| Экономика базового сценария | 7/10 | Операционная модель | 6/10 |
| Структура сделки (аренда) | 5/10 | Состояние активов | 4/10 |
| Стоимость финансирования | 4/10 | Юридическая готовность | 3/10 |

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

**60** /100

Проект обоснованно переводится в стадию полноценного due diligence, но **не готов к инвестиционному решению** в текущем состоянии данных.

ПОТЕНЦИАЛ РЕЙТИНГА

| | |
|---|---|
| Получено АПЗ и полный пакет документов | +10 |
| Подтверждён фактический вагонопоток | +8 |
| Подписаны якорные клиенты | +7 |
| Зафиксирована аренда в пределах потолка | +5 |
| **Целевой рейтинг после снятия блокеров** | **85–90** |

# Итоговый вывод и следующие шаги

**Да — проект стоит изучать и доводить до инвестиционного решения. Но входить в него следует как в терминальный бизнес, а не как в строительство склада.**

Ценность создаётся комбинацией «ЖД-тупик + склад + открытая площадка + ПРР + ответственное хранение + 3PL», а не арендой 5 000 м². При аренде выше расчётного потолка проект превращается в обычный складской актив.

## ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

1. **Условия аренды**
   Ставка, срок, индексация, каникулы, право залога и субаренды
2. **Кадастровые и правоустанавливающие документы**
   Кадастровый номер, план, целевое назначение, обременения
3. **Технический паспорт ЖД-тупика**
   Схема, профиль, вместимость, договор примыкания
4. **Фактический вагонопоток за 24–36 месяцев**
   Помесячно, с номенклатурой и простоями
5. **Техническое обследование зданий и кранов**
   Заключение специализированной организации

### Результат следующего этапа

Полноценный Feasibility Study / Investment Memorandum с финансовой моделью на 10 лет (помесячно первые 24 месяца): P&L, Cash Flow, EBITDA, FCF, NPV, IRR, DSCR, payback и break-even occupancy.

Итоговая формулировка для инвестиционного комитета будет иметь вид: **«при арендной ставке X проект обеспечивает IRR Y%; максимально допустимая аренда — Z ₸/мес»**.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Привлекательность проекта не завышается искусственно. Если после пересчёта на актуальных данных проект не проходит по IRR или DSCR — это будет зафиксировано прямо, с указанием предельных условий входа.
